


Buyer personal

Escenario que el PO considera importante y va a aprobar

Product Owner prioriza las historias en el Product Backlog

User story → Función vertical



→ Req. funcionando

1 PO por producto (puede tener un representante cuando le ayente)

siempre el PO tiene del negocio (cliente, vendedor, gerente, capacitado, experto en el dominio)

US completa

- ↳ Expresión
- ↳ Criterio de aceptación
- ↳ Frase verbal
- ↳ Prueba de usuario (algunos que fallan y algunos que pasan)

Parcial

↳ Userstory completa

Estimar en ambientes ágiles

PP → Estimar = predecir

Matriz de desambiguación

- ↳ Objetivo
 - ↳ Meta de negocio deseada
- ↳ Estimación
 - ↳ Predicción analítica imparcial de esfuerzo o costo
- ↳ Compromiso
 - ↳ Promesa de entrega asumiendo riesgos.
 - ↳ Se acuerda con el cliente una vez acordado la estimación
 - ↳ Lo que queremos lograr con la planificación

DESARROLLAR

Dinámica destructiva subestimación

- 1) Cronograma lineal hecho por el negocio
- 2) Se recortan actividades (Análisis, diseño)
- 3) Se programan soluciones sucias
- 4) Altas tasas de defecto en etapa de testing o producción
- 5) Reunión de crisis y reautorización tardía

Cono de incertidumbre

- ↳ Varía incertidumbre
- ↳ Termina antes → **sobreestimado**
- ↳ Estimaciones se piden demasiado pronto → **Preestimación** → Propuesta de proyecto.
- ↳ Empresas no quieren hacer una preestimación que puede no cobrarse

Buena estimación

- ↳ Expresada en rangos (no exactitud) → entre x y z.
- ↳ Incluye porcentaje de probabilidad (de terminar en esa fecha)
- ↳ Estimación separada del objetivo de negocio.

us = user story
sp = story point

Estimaciones ágiles

Porque son ágiles

- ↳ Porque trabajan con estimaciones relativas y no absolutas
- ↳ Estimar por comparación
- ↳ No usa escalas lineales → **Escala Fibonacci** → crecimiento exponencial de la complejidad
- ↳ Esfuerzo = Individual (no se puede sistematizar)
- ↳ Estima → quien hace el proyecto (quien trabaja)

↳ Horas lineales personales.

Técnica menos precisa Fibonacci


Técnica remera

- ↳ En el Product Backlog
- ↳ Tamaño en remera de US.

Story Point (SP)

3 dimensiones

- ↳ Complejidad
- ↳ Esfuerzo de quien hace el trabajo
- ↳ Incertidumbre (Mas incertidumbre cuando menos información)

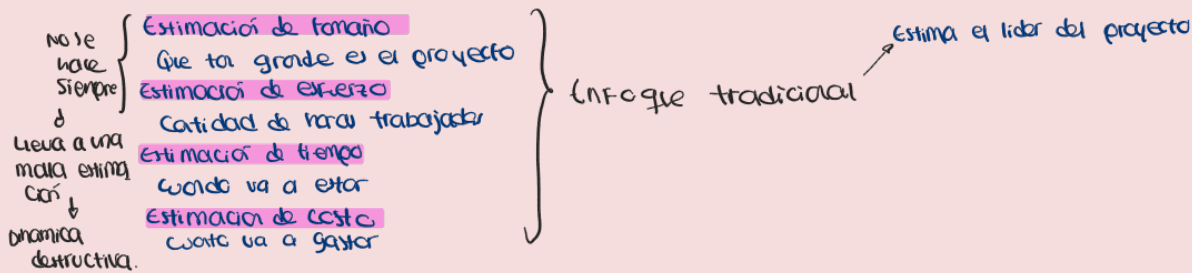

Métrica de agilidad → VELOCIDAD

- ↳ Cantidad de sp que el PO me acepto al final de la iteración (presentar el incremento)
- ↳ Velocidad se calcula (no se estima)
- ↳ se suman las SP ACEPTADAS por el PO. (los terminados).

Poker estimation

- ↳ equipo elige us canónica
 - ↳ Tomada como referencia para compararla con las otras.
- ↳ se elige una fácil nivel de dificultad 1 y se compara diciendo cuantas veces más difícil es esta respecto a la otra.
- 0 → RNF o restricciones (no se estiman)
- 1 → us canónica
- ? → Mucha incertidumbre o spikes
- ↳ us con num alto debería poder partirse

Sprint → iteración de duración fija

- PO lee historia → Discutir → estimar el privado → Mediar simultáneamente → Discutir extremos.
- ↳ no condicionar y que
 - ↳ no me condicionen

Cuando Reestimar

- ↳ si el tamaño que estimamos erroneo → se vuelve a estimar
- ↳ si no la terminamos para el final del sprint → NO se vuelve a estimar

Duración máxima de un sprint → 4 semanas

versión del producto que tiene ciertas características.

MVP - Producto mínimo viable

- ↳ se usa para validar una hipótesis
- ↳ Alguien quiere el producto? vamos a conseguir proveedores?
- ↳ Estamos por construir el producto correcto?
- ↳ Puede no ser sw → Prototipo, video, maqueta

MMP - Producto mínimo comercializable

- ↳ Debe ser sw funcionando
- ↳ Cantidad min de características que el producto tiene que tener para generar una versión que se pueda poner en producción (y le sirva al negocio).

MUP - Producto mínimo usable

- ↳ Hay tanta oferta que hay 1 sola oportunidad para que el usuario sea feliz usando el producto
- ↳ No solo es que funcione.

Proceso de sw

- ↳ Proceso definido
- ↳ Conjunto estructurado de actividades que permiten el desarrollo de un producto de sw

Proyecto (4P)

- ↳ Unidad de gestión del trabajo
- ↳ Me da como resultado un producto
- ↳ Proyecto ≠ Proceso → necesitan distintos saberes y roles

Roles 4P

- ↳ Producto → Testing, Analista, Diseño, UX, Desarrollador
- ↳ Proyecto → Líder Proyecto

ESTRAPOLACIÓN PROCESOS

Proceso empírico → experiencia no se traslada a otro equipo o proyecto

- Definido
 - ↳ No es que no se pueden hacer cambios
 - ↳ creen que se puede definir de antemano lo que necesito para hacer sw.
 - ↳ experiencia se puede trasladar de un equipo o proyecto
 - ↳ Basarse de una experiencia anterior para estimar
